

사업주체	임기구분	추진구분	사업기간	총사업비 (백만원)	추진상황	
					이행률	이행구분
경제청	임기 후	신규	'23~'28	비예산	20%	정상추진

공약실천계획

정책목표	북측수로 수변공원 관련 주민숙원사업인 달빛공원 미조성 부지 조기 조성																				
정책개요	○ 사업대상 : 송도 워터프런트 1-2단계 사업 지역 ○ 사업위치 : 달빛공원 미조성 구간 (송도국제교~바이오산업교) ○ 사업기간 : 2023. ~ 2028. (경제청 환경녹지과-'23 설계·환경평가 용역 예정) ○ 사업내용 : 달빛공원 미조성 부분(워터프런트 1-2단계 지역) 추가 조성[탐방로(산책로)와 관찰데크, 벤치, 조경식재 등] ⇒ 환경영향평가 등 환경부(한강유역환경청) 협의 조건에 부합하는 시설로 제한																				
추진일정	세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	주민의견조회 간담회																				
	기본 및 실시설계 용역																				
	공원조성사업																				
소요예산 (백만원)	총합	2022				2023				2024				2025				2026			
	비예산																				
변경사항	이행목표(사유 : 대규모 공약으로 메니페스토실천본부 완료기준에 따라 수정) * 조성사업- 입법 및 재정확보 후 사업 개시)																				

추진 실적

□ 연차별 계획대비 주요 실적

공약이행 확인지표	2024.3월 기준 이행 현황		2022	2023	2024	2025	2026
공원조성사업 추진율 (누적)	목표	100%	-	20%	50%	80%	100%
				기본계획 용역	기본계획 용역	실시설계 용역	공사 착공*
	실적	20%	-	20%	20%		
			경제청 업무간담회	(본)설계비 확보 용역사 선정	용역중지		

※ 임기내 목표 : 북측 수변공원 공사 착공

※ 대규모공약사업으로 매니페스토실천본부 공약 완료기준에 따라 임기 내에는 조성공사 착공 (100%)을 목표로, 임기 후 지속 추진하여 완료 예정.


□ 세부 추진 내용

- 2022. 10월 : 송도관리단 ↔ 경제청 환경녹지과 간담회(1차) 실시
⇒ 북측수로 수변공원 조기 조성 요청 등
- 2023년도 본예산 용역비(5억) 확보(경제청)
- 2023. 6월 : 기본계획 용역 시행 및 용역사 선정(한국종합기술 외 1개사)
- 2024. 2. 26. : 기본계획 용역 중지
※ 행정절차 이행 중(BF 인증 및 교통영향평가 변경 심의 등)
- 2024. 3. 14. : 경제청 환경녹지과 간담회(2차) 실시
⇒ 북측수로 수변공원 진행상황 공유 등

향후 계획

- 2024. : 기본계획 용역 재개 및 준공, 실시설계 용역비 편성
- 2025. : 실시설계 용역 계약 및 착·준공, 공원 조성 사업비 편성
- 2026. ~ 2028. : 달빛공원 미조성 부지 조성공사 계약 및 착·준공

□ 관련사진

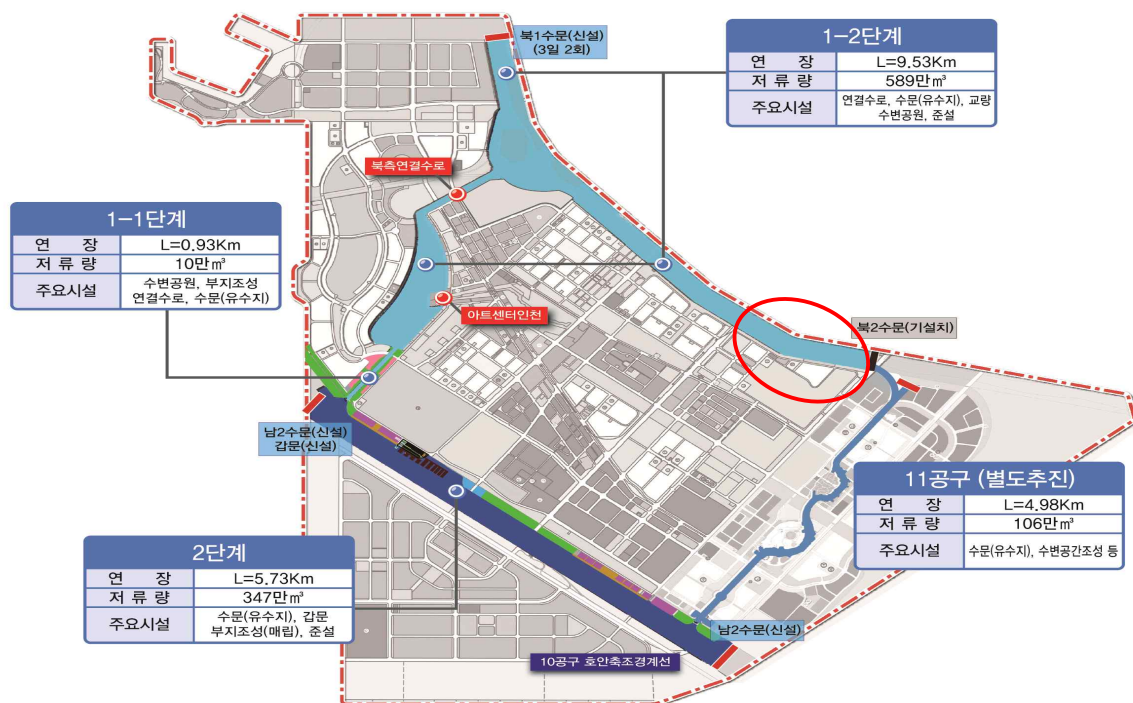

위치도



현장사진
